


# Nieuwbouw scholen start in najaar met Sterrenschool in Sonniuspark

Hoewel het ontwerp voor de nieuwe Sterrenschool, ter vervanging van basisschool De Gentiaan, nog niet klaar is, gaat de gemeente in een aangepaste planning er vooralsnog van uit dat de bouw van de Sterrenschool in Sonniuspark op 31 oktober van start gaat.

door Marleen Benschop

En hoewel basisschool De Bloktempel nog bezig is met het zoeken naar tijdelijke huisvesting – in de hoop begin volgend jaar met de nieuwbouw te kunnen beginnen – gaat de gemeente er van uit dat die start toch pas op 1 januari 2015 is, omdat dan het lege oude gebouw van De Gentiaan als tijdelijke opvang kan dienen. De nieuwbouw van de Stoklandschool staat gepland op 2 januari 2014. De commissie Burgerzaken bespreekt volgende week dinsdag de notitie 'Bijkomende kosten en planning rond de nieuwbouw van de scholen'.

Zoals in Son en Breugel wel meer

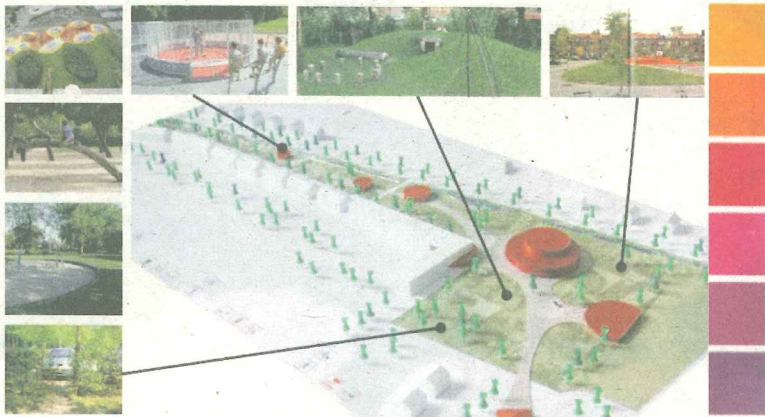

*De Sterrenschool: niet alleen het ontwerp is nog niet klaar, er is ook nog geen zicht op de extra kosten*

dingen samenhangen, is ook de bouw van zes nieuwe basisscholen en twee kinderdagverblijven een lastige logistieke stoelendans, omdat voor tijdelijke huisvesting in de meeste gevallen gebruik gemaakt moet worden van de bestaande schoolgebouwen.

En als de eerste in de rij dan vertraging oploopt heeft dat direct gevolgen voor nummer twee op de planning. Zo heeft de nieuwbouw van De Gentiaan al pakweg een jaar vertraging op-

gelopen, nadat duidelijk werd dat de integrale opzet van een Sterrenschool met daarbij een gezondheidscentrum en (school)woningen, geen haalbare kaart was.

Een paar maanden geleden werd besloten om alleen een Sterrenschool te bouwen, waarvoor dan een nieuw ontwerp moet komen.

Tja, en dan heb je als Bloktempel pech, want die kan pas gaan vernieuwbouwen als De Gentiaan is verhuisd

naar hun nieuwe onderkomen.

Voor de Stoklandschool gelden die problemen niet, want die kunnen in hun oude gebouw blijven zitten als daarnaast de nieuwe school wordt neergezet. Als die klaar is, zou op 1 januari 2015 de nieuwbouw van de Regenboog (samen met een Woon-Zorgcombinatie) kunnen beginnen, en kan die school als tijdelijke huisvesting de oude Stoklandschool gebruiken. Nieuwbouw van De Harlekijn en De Sonnewijzer is pas voorzien in respectievelijk 2017 en 2018.

Ook binnen de kinderopvang vinden er verschuivingen plaats. In Breugel kan Piggelmee tijdens de bouw van de Stoklandschool blijven zitten, en als de nieuwe Stokland klaar is, betreft Piggelmee daar ook een ruimte. Korein aan de Jupiterstraat wordt afgebroken, zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang. De dagopvang gaat naar de Genovevastraat (gebouw IVN/scouting Margaretha Sinclair) en

de Ruysdaelstraat. De buitenschoolse opvang wordt tijdelijk gecombineerd met de buitenschoolse opvang in De Regenboog.

Het kan dus zo zijn dat er op 31 oktober aan de Bijenlaan in Sonniuspark alleen een bord komt te staan waarop de bouw van de nieuwe Sterrenschool staat aangekondigd.

Of zou deze voorlopige planning toch weer wishful thinking kunnen zijn?

Want niet alleen het ontwerp is nog niet klaar, er is ook nog geen zicht op de extra kosten voor wat er op gebied van parkeren en mogelijke aanpassingen van wegen moet gebeuren.

'De planontwikkeling is nog niet zo ver', staat er in het commissievoorstel. Voor De Stokland en De Bloktempel zijn alle plaatjes wel al bekend.

De kosten voor de aanpassing van wegen en parkeerplaatsen worden geraamd op totaal 450.000 euro. En een nieuwe groenvoorziening bij deze twee scholen kost totaal ruim 90.000 euro.
